INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 1 DE 7

Project Charter

Acta de constitución del proyecto ENTS — Everyone Needs To Smile

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-01
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Acta original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Reescritura completa para el sistema de peticiones vecinales: propósito, objetivos, alcance, hitos, riesgos, presupuesto e interesados.

Contenido

1. Información general del proyecto
2. Propósito y justificación
3. Descripción del proyecto y del producto
4. Objetivos y criterios de éxito
5. Requisitos de alto nivel
6. Alcance preliminar
7. Entregables principales
8. Supuestos y restricciones
9. Riesgos iniciales
10. Cronograma de hitos
11. Presupuesto y recursos
12. Interesados
13. Equipo, roles y autoridad
14. Aprobación

1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto	ENTS — Everyone Needs To Smile
Descripción breve	Plataforma web de peticiones vecinales con procesamiento de datos y medición de impacto para Córdoba y Villa Allende.
Organización	Instituto Cervantes — Cátedra Práctica Profesionalizante
Patrocinador	Docente de la cátedra, Ing. Loza
Director del proyecto	[integrante designado]
Equipo	Jiménez, Ignacio · Andrada, Juan Pablo · Patrón, Máximo
Fecha de inicio	[__/__/____] (reorientación del proyecto)
Fecha estimada de cierre	[__/__/____] (entrega y defensa)
Producto publicado	https://entscordoba.netlify.app

2. Propósito y justificación

2.1 Problema

En los barrios de Córdoba los mismos problemas —baches, falta de alumbrado, basurales, inseguridad, falta de atención sanitaria— se reclaman una y otra vez, de manera individual y por canales dispersos. El vecino no sabe si alguien recibió su reclamo ni qué pasó con él; los organismos públicos y las organizaciones sociales no cuentan con información ordenada por zona, urgencia y apoyo vecinal para decidir qué atender primero ni para rendir cuentas de lo realizado.

2.2 Justificación

La primera versión del proyecto proponía una plataforma de donaciones. Durante el análisis se concluyó que el módulo de pagos implicaba integraciones con pasarelas, obligaciones legales y trazabilidad de fondos desproporcionadas para el equipo y el plazo, y que el mayor valor estaba en **ordenar y procesar la demanda vecinal**. Por eso el proyecto se reorienta hacia un sistema de peticiones ciudadanas que:

- concentra los reclamos de un barrio en peticiones únicas, apoyadas con firmas;
- las procesa automáticamente (categoría, barrio, score de urgencia, detección de similares);
- las pone a disposición de las áreas del municipio para que respondan y registren el avance;
- genera reportes para organismos y ONG, y estadísticas públicas para la comunidad.

La reorientación conserva lo ya trabajado —encuesta y estudio de necesidades, análisis socioeconómico de Córdoba, arquitectura en capas, base de datos SQL, autenticación y seguridad, enfoque de evaluación de impacto— y reemplaza el módulo de pagos por el módulo de reportes.

3. Descripción del proyecto y del producto

El proyecto consiste en analizar, diseñar, desarrollar, probar, publicar y documentar una aplicación web —instalable en el celular— con las siguientes capacidades:

Módulo	Descripción
Cuentas y roles	Registro e ingreso (correo o Google), recuperación de contraseña; roles de vecino, funcionario por área, administrador y dueño.
Peticiones	Alta con texto, hasta 3 fotos y ubicación; moderación previa a la publicación.
Procesamiento automático	Categoría según el texto, barrio según la ubicación, score de urgencia de 0 a 100, detección de peticiones similares y revisión de datos personales y lenguaje.
Firmas y prioridad	Firma única por persona; prioridad por cantidad de firmas; elevación automática al área al llegar a 50.
Seguimiento	Cinco etapas (recibida, en revisión, derivada, en obra, resuelta) con respuesta oficial y foto; notificaciones a autor y firmantes.
Comunidad	Mapa por barrios, muro vecinal, agenda de eventos, comentarios anónimos y barrios seguidos.
Reportes	Estadísticas públicas anónimas, panel analítico y exportación a Excel y PDF.

4. Objetivos y criterios de éxito

4.1 Objetivo general

Poner en funcionamiento una plataforma web que permita a los vecinos de Córdoba y Villa Allende visibilizar, apoyar y seguir la resolución de los problemas de su barrio, y que procese esa información para que los organismos prioricen y registren su respuesta.

4.2 Objetivos específicos medibles

#	Objetivo	Indicador	Meta
1	Publicar la plataforma accesible desde la web y como app instalable.	Sitio en línea con HTTPS y manifiesto de app	Disponible al cierre
2	Clasificar automáticamente cada petición nueva.	% de peticiones con categoría, barrio y score asignados	100%
3	Cubrir el territorio de Córdoba y Villa Allende.	Barrios cargados con ubicación	≥ 100 barrios
4	Completar el ciclo de la petición.	Etapas de seguimiento operativas	5 de 5
5	Garantizar la privacidad entre vecinos.	Pruebas de permisos por rol aprobadas	100%

#	Objetivo	Indicador	Meta
6	Asegurar la calidad del código.	Pruebas automáticas aprobadas antes de publicar	100%
7	Entregar la documentación de gestión.	Entregables completos	7 de 7

4.3 Criterios de éxito del proyecto

- El ciclo completo —pedir, firmar, priorizar, responder y resolver— funciona de punta a punta en el sitio publicado.
- Ningún vecino puede ver la identidad de otro ni datos personales ajenos.
- La documentación cumple la estructura exigida por la cátedra y es aprobada por el docente.

5. Requisitos de alto nivel

Funcionales

- Crear, moderar, firmar y comentar peticiones.
- Asignar categoría, barrio y urgencia automáticamente.
- Avisar peticiones similares antes de crear una nueva.
- Registrar respuestas oficiales por área.
- Notificar novedades a los interesados.
- Mostrar mapa por barrios y estadísticas.
- Exportar reportes para organismos.

No funcionales

- Privacidad: anonimato entre vecinos.
- Seguridad: reglas aplicadas en la base de datos, HTTPS.
- Usabilidad: español, adaptable a celular, modo oscuro.
- Accesibilidad: teclado, contraste, movimiento reducido.
- Rendimiento: carga por partes, fluidez en celulares.
- Mantenibilidad: pruebas automáticas y esquema versionado.

6. Alcance preliminar

Dentro del alcance

- Aplicación web e instalable (PWA).
- Base de datos con reglas de seguridad por fila.
- Procesamiento automático de peticiones.
- Seguimiento, notificaciones y comentarios.
- Mapa, comunidad y eventos.
- Estadísticas, panel analítico y exportes.
- Documentación y presentación del proyecto.

Fuera del alcance

- Pagos, donaciones o recaudación dentro de la plataforma.
- Integración con sistemas internos del municipio.
- Notificaciones por correo o SMS.
- Aplicaciones nativas para tiendas.
- Polígonos oficiales de los barrios.

El detalle completo se desarrolla en el Entregable 2, Declaración de alcance.

7. Entregables principales

#	Entregable	Descripción
1	Aplicación web publicada	Sitio en producción con todos los módulos del alcance.
2	Base de datos documentada	Esquema SQL completo y reproducible, con políticas y funciones.
3	Repositorio de código	Código fuente versionado, con instrucciones de instalación y pruebas.
4	Entregables de gestión	Project Charter, declaración de alcance, EDT, lista y diccionario de actividades, plan de comunicación y Gantt.
5	Documentación técnica	Requerimientos, arquitectura, modelo de datos, seguridad, pruebas e implementación.
6	Presentación	Exposición del proyecto para la defensa.

8. Supuestos y restricciones

8.1 Supuestos

- Los vecinos cuentan con un celular o computadora con conexión a internet y un navegador actualizado.
- Los servicios en la nube elegidos (GitHub, Supabase, Netlify, OpenStreetMap) mantienen sus planes gratuitos durante el proyecto.
- Para la operación real, los organismos designan funcionarios por área que responden las peticiones.
- Los integrantes del equipo mantienen su disponibilidad durante el ciclo lectivo.

8.2 Restricciones

- **Tiempo:** el proyecto debe entregarse dentro del calendario de la cátedra.
- **Equipo:** tres integrantes con dedicación parcial.
- **Presupuesto:** sin financiamiento; solo herramientas y servicios gratuitos.
- **Técnicas:** sin acceso a sistemas internos del municipio; límites de uso de los planes gratuitos.
- **Legales:** cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales; publicación de una política de privacidad.

9. Riesgos iniciales

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Respuesta planificada
R1	Baja participación de vecinos al inicio	Media	Alto	Prueba piloto en un barrio, difusión en redes y app instalable de uso simple.
R2	Publicación de datos personales o contenido ofensivo	Media	Alto	Moderación previa, revisión automática de textos, denuncias y ocultamiento automático.
R3	Acceso indebido a identidades o datos	Baja	Alto	Reglas de seguridad en la base (RLS, permisos por columna) y pruebas por rol.
R4	Superar los límites de los planes gratuitos	Baja	Medio	Compresión de fotos, monitoreo de uso y plan de migración a un plan pago.
R5	Caída o cambio de un servicio externo	Baja	Medio	Esquema SQL versionado para recrear la base; código desacoplado del proveedor de publicación.
R6	Indisponibilidad de un integrante	Media	Medio	Documentación del repositorio, revisión cruzada y tareas repartidas en sprints cortos.
R7	Cambios de alcance tardíos	Media	Medio	Control de cambios con aprobación del docente (ver Plan de comunicación).

10. Cronograma de hitos

#	Hito	Fecha	Estado
H1	Reorientación del proyecto aprobada	[__/__/____]	Cumplido
H2	Project Charter y alcance aprobados	[__/__/____]	[estado]
H3	Diseño de arquitectura y base de datos	[__/__/____]	Cumplido
H4	Primera versión funcional: autenticación, peticiones, firmas y moderación	04/10/2026	Cumplido
H5	Roles, anonimato e ingreso con Google	11/10/2026	Cumplido
H6	Procesamiento automático, seguimiento y reportes	12/10/2026	Cumplido

#	Hito	Fecha	Estado
H7	Calidad: pruebas, accesibilidad, app instalable y rendimiento	12/10/2026	Cumplido
H8	Documentación y presentación completas	[__/__/____]	En curso
H9	Entrega y defensa	[__/__/____]	Pendiente

Las fechas de H4 a H7 corresponden a las versiones registradas en el repositorio del proyecto.

11. Presupuesto y recursos

11.1 Recursos tecnológicos

Recurso	Uso	Costo
GitHub	Repositorio privado y control de versiones	Plan gratuito — $0
Supabase	Base de datos PostgreSQL, autenticación y almacenamiento de fotos	Plan gratuito — $0
Netlify	Publicación del sitio con HTTPS	Plan gratuito — $0
OpenStreetMap	Mapas y ubicación de barrios	Gratuito — $0
Google Cloud (OAuth)	Ingreso con cuenta de Google	Gratuito — $0
Herramientas de desarrollo	Node.js, React, Vite, editor de código	Código abierto — $0

11.2 Recursos humanos

Concepto	Cantidad	Total
Horas de trabajo por integrante	[__] h	[__] h
Integrantes	3	—
Valor hora de referencia (estimación académica)	$[___]	$[___]

> El costo monetario directo del proyecto es $0 gracias a los planes gratuitos. El costo en horas de trabajo se incluye como referencia: completar con las horas registradas por el equipo.

12. Interesados

Interesado	Rol en el proyecto	Interés / expectativa	Influencia
Docente (Ing. Loza)	Patrocinador; aprueba alcance y entregables	Cumplimiento de objetivos académicos y de la metodología	Alta
Equipo de proyecto	Planifica, desarrolla y documenta	Entregar un producto funcional y aprobar la materia	Alta

Interesado	Rol en el proyecto	Interés / expectativa	Influencia
Vecinos de Córdoba y Villa Allende	Usuarios principales	Que sus reclamos se vean, se atiendan y se resuelvan	Media
Áreas del municipio y funcionarios	Usuarios que responden	Información priorizada por zona y urgencia	Alta
ONG y organizaciones sociales	Destinatarios de reportes	Datos para orientar su trabajo territorial	Media
Instituto Cervantes	Institución	Calidad de la formación y de los proyectos	Media

13. Equipo, roles y autoridad

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Jiménez, Ignacio	[rol]	[responsabilidades]
Andrada, Juan Pablo	[rol]	[responsabilidades]
Patrón, Máximo	[rol]	[responsabilidades]

Roles sugeridos: director del proyecto, responsable de desarrollo y base de datos, responsable de diseño y experiencia de usuario, responsable de calidad y documentación.

13.1 Autoridad del director del proyecto

- Asignar y redistribuir tareas entre los integrantes dentro de cada sprint.
- Priorizar el product backlog dentro del alcance aprobado.
- Aprobar la publicación de nuevas versiones del sitio.
- Escalar al docente los cambios de alcance, plazo o riesgos críticos.

14. Aprobación

Con la firma de este documento se autoriza formalmente el inicio del proyecto ENTS con el propósito, los objetivos, el alcance preliminar y los recursos aquí descritos.

Ing. Loza
Docente — Patrocinador
Fecha: ___/___/_____

[Director del proyecto]
Director del proyecto
Fecha: ___/___/_____

Jiménez, Ignacio
Integrante
Fecha: ___/___/_____

Andrada, Juan Pablo
Integrante
Fecha: ___/___/_____

Patrón, Máximo
Integrante
Fecha: ___/___/_____

INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 2 DE 7

Declaración de alcance

Scope Statement del proyecto ENTS — Everyone Needs To Smile

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-02
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Reescritura completa para el sistema de peticiones vecinales: alcance del producto, requisitos, entregables, exclusiones y control de cambios.

Contenido

1. Objetivo del documento
2. Alcance del producto
3. Requisitos funcionales
4. Requisitos no funcionales
5. Entregables del proyecto
6. Criterios de aceptación del producto
7. Exclusiones
8. Supuestos y restricciones
9. Límites e interfaces del sistema
10. Control de cambios del alcance
11. Aprobación

1. Objetivo del documento

Este documento define en detalle qué incluye y qué no incluye el proyecto ENTS, a partir del alcance preliminar del Project Charter. Sirve como referencia para planificar, ejecutar y aceptar el trabajo, y para evaluar cualquier pedido de cambio.

2. Alcance del producto

ENTS es una aplicación web adaptable a celular e instalable (PWA) en la que los vecinos de Córdoba y Villa Allende publican problemas de su barrio, los apoyan con firmas y siguen su resolución; los funcionarios de cada área del municipio responden y registran el avance; y los administradores moderan, analizan y exportan la información. Sus características principales son:

Característica	Descripción
Cuentas y roles	Registro e ingreso con correo o Google; recuperación de contraseña; roles de vecino, funcionario por área, administrador y dueño.
Peticiones	Título, descripción, hasta 3 fotos comprimidas y ubicación en mapa; quedan pendientes hasta su moderación.
Procesamiento automático	Categoría (16) por palabras clave, barrio (111) por cercanía, score de urgencia, detección de similares y revisión de textos.
Firmas y prioridad	Una firma por persona; cinco niveles de prioridad; elevación al área a las 50 firmas.
Seguimiento	Etapas recibida → en revisión → derivada → en obra → resuelta, con respuesta oficial y foto.
Participación	Notificaciones, comentarios anónimos con denuncias, barrios seguidos e insignias.
Comunidad	Mapa por barrios, muro vecinal y agenda de eventos.
Reportes	Estadísticas públicas anónimas, panel analítico, exportación a Excel y PDF.
Administración	Moderación, directorio de usuarios, asignación de áreas, cambio de roles (solo dueño) y documentos privados.

3. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF01	Registrar usuarios con correo y contraseña o con Google; recuperar la contraseña por correo.	Alta
RF02	Elegir el tipo de cuenta al registrarse (vecino o funcionario, este último sujeto a aprobación).	Alta
RF03	Crear peticiones con título, descripción, hasta 3 fotos y ubicación en el mapa.	Alta
RF04	Sugerir automáticamente la categoría según el texto y el barrio según la ubicación.	Alta
RF05	Calcular automáticamente el score de urgencia (0 a 100) de cada petición.	Alta

ID	Requisito	Prioridad
RF06	Advertir peticiones similares antes de crear una nueva.	Alta
RF07	Moderar las peticiones antes de publicarlas (aprobar, rechazar, editar, eliminar).	Alta
RF08	Firmar y retirar la firma; ordenar el inicio por prioridad según firmas.	Alta
RF09	Elevar automáticamente al área las peticiones que alcanzan 50 firmas.	Media
RF10	Registrar respuestas oficiales y la etapa de seguimiento con foto.	Alta
RF11	Notificar a autor y firmantes de cada novedad; permitir seguir barrios.	Media
RF12	Comentar en forma anónima, denunciar y moderar comentarios.	Media
RF13	Mostrar el mapa por barrios coloreado por peticiones, firmas o urgencia.	Media
RF14	Ofrecer estadísticas públicas anónimas y un panel analítico para administradores.	Media
RF15	Exportar reportes de peticiones y barrios a Excel y PDF.	Media
RF16	Asignar áreas a funcionarios y mostrarles una bandeja de su área.	Media
RF17	Permitir solo al dueño del proyecto cambiar el rol de las cuentas.	Baja
RF18	Publicar en el muro vecinal y consultar la agenda de eventos por barrio.	Baja

4. Requisitos no funcionales

ID	Atributo	Requisito
RNF01	Privacidad	Anonimato entre vecinos; identidades visibles solo para funcionarios y administradores.
RNF02	Seguridad	Reglas de acceso aplicadas en la base de datos (RLS); comunicación por HTTPS.
RNF03	Usabilidad	Interfaz en español, adaptable a celular, modo claro y oscuro.
RNF04	Accesibilidad	Navegación con teclado, foco visible, movimiento reducido, tablas alternativas a los gráficos.
RNF05	Rendimiento	Carga por partes de cada página; animaciones reducidas en celulares.
RNF06	Disponibilidad	Aplicación instalable (PWA) que abre aun con conexión inestable.
RNF07	Mantenibilidad	Revisión automática de código, pruebas automáticas y esquema SQL versionado.
RNF08	Legal	Política de privacidad publicada; cumplimiento de la Ley 25.326.

5. Entregables del proyecto

#	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación
1	Aplicación web publicada	Sitio en producción con todos los módulos del alcance.	Todas las características operativas en el sitio publicado.

#	Entregable	Descripción	Criterio de aceptación
2	Base de datos	Esquema SQL con tablas, políticas, funciones y disparadores.	Se recrea completa ejecutando `schema.sql`.
3	Repositorio de código	Código fuente versionado con README e instrucciones.	Otro integrante puede instalarlo y correrlo siguiendo el README.
4	Suite de pruebas	Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol.	100% aprobadas antes de cada publicación.
5	Entregables de gestión	Charter, alcance, EDT, actividades, diccionario, comunicación y Gantt.	Completos y consistentes entre sí.
6	Documentación técnica	Requerimientos, arquitectura, datos, seguridad, pruebas e implementación.	Refleja el sistema implementado.
7	Presentación	Exposición del proyecto para la defensa.	Aprobada por el equipo y ensayada.

6. Criterios de aceptación del producto

- El ciclo completo —pedir, moderar, firmar, priorizar, responder y resolver— funciona en el sitio publicado.
- Toda petición nueva recibe categoría sugerida, barrio y score de urgencia sin intervención manual.
- Un vecino no puede ver la identidad de otros vecinos ni modificar datos ajenos (verificado con pruebas por rol).
- No se publican teléfonos, correos ni documentos en los comentarios.
- La aplicación se puede instalar en el celular y navegar con teclado.
- Las pruebas automáticas se ejecutan sin errores y la compilación de producción es exitosa.

7. Exclusiones

Fuera del alcance	Motivo
Pagos, donaciones o recaudación dentro de la plataforma	Complejidad legal y de integración; si se coordinan donaciones, ocurren por fuera.
Integración con sistemas internos del municipio	Sin acceso a esos sistemas; los funcionarios responden desde ENTS.
Notificaciones por correo electrónico o SMS	Requiere servicios pagos; se usan notificaciones dentro de la app.
Aplicaciones nativas para Android o iOS	Se cubre con la aplicación instalable (PWA).
Polígonos oficiales de los barrios	Se usan los centros de OpenStreetMap; se evalúa como mejora futura.
Atención de reclamos en forma directa por el equipo	El equipo provee la herramienta; la resolución corresponde a los organismos.

8. Supuestos y restricciones

Supuestos

- Los usuarios tienen acceso a internet y un navegador actualizado.
- Los servicios gratuitos se mantienen durante el proyecto.
- Los organismos designan funcionarios por área para la operación real.
- El equipo mantiene su disponibilidad durante el ciclo lectivo.

Restricciones

- Plazo: calendario de la cátedra.
- Equipo: tres integrantes con dedicación parcial.
- Presupuesto: $0 (solo servicios gratuitos).
- Legales: Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

9. Límites e interfaces del sistema

Sistema externo	Interfaz	Uso
Supabase	API REST y cliente JavaScript sobre HTTPS	Base de datos, autenticación, almacenamiento de fotos y documentos.
Netlify	Publicación continua desde GitHub	Sitio en producción con HTTPS.
OpenStreetMap	Teselas del mapa; Nominatim (carga única de barrios)	Mapa vecinal y ubicación de barrios.
Google	OAuth 2.0	Ingreso con cuenta de Google (opcional).
Navegador del usuario	Geolocalización, cámara/archivos, service worker	Ubicación de la petición, fotos e instalación de la app.

10. Control de cambios del alcance

1. Cualquier integrante registra el pedido de cambio (qué, por qué, impacto estimado en tiempo y calidad).
2. El equipo lo analiza en la siguiente reunión de planificación.
3. Si afecta objetivos, entregables o plazos, se presenta al docente para su aprobación.
4. Si se aprueba, se actualizan este documento, la EDT, la lista de actividades y el Gantt, y se registra en el historial de revisión.

> Ejemplo de cambio aprobado: reemplazo del módulo de pagos y donaciones por el sistema de peticiones (versión 2.0 de este documento).

11. Aprobación

Ing. Loza
Docente — Patrocinador
Fecha: ___/___/_____

[Director del proyecto]
Director del proyecto
Fecha: ___/___/_____

INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 3 DE 7

EDT / WBS

Estructura de desglose del trabajo del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-03
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Nueva EDT orientada a entregables para el sistema de peticiones vecinales (7 componentes, 29 paquetes de trabajo).

Contenido

1. Criterios de construcción
2. Diagrama de la EDT
3. EDT en formato de lista
4. Relación con las actividades

1. Criterios de construcción

- **Orientada a entregables:** cada elemento representa un resultado verificable, no una tarea suelta.
- **Regla del 100%:** la EDT incluye todo el trabajo del proyecto y nada que esté fuera del alcance aprobado.
- **Tres niveles:** proyecto (nivel 1), componentes (nivel 2) y paquetes de trabajo (nivel 3).
- **Codificación jerárquica:** cada paquete se identifica con un código (por ejemplo, 1.4.3) que se usa en la lista y el diccionario de actividades.

Componentes (nivel 2)	7
Paquetes de trabajo (nivel 3)	29
Actividades asociadas	20 (ver Entregable 4)

2. Diagrama de la EDT

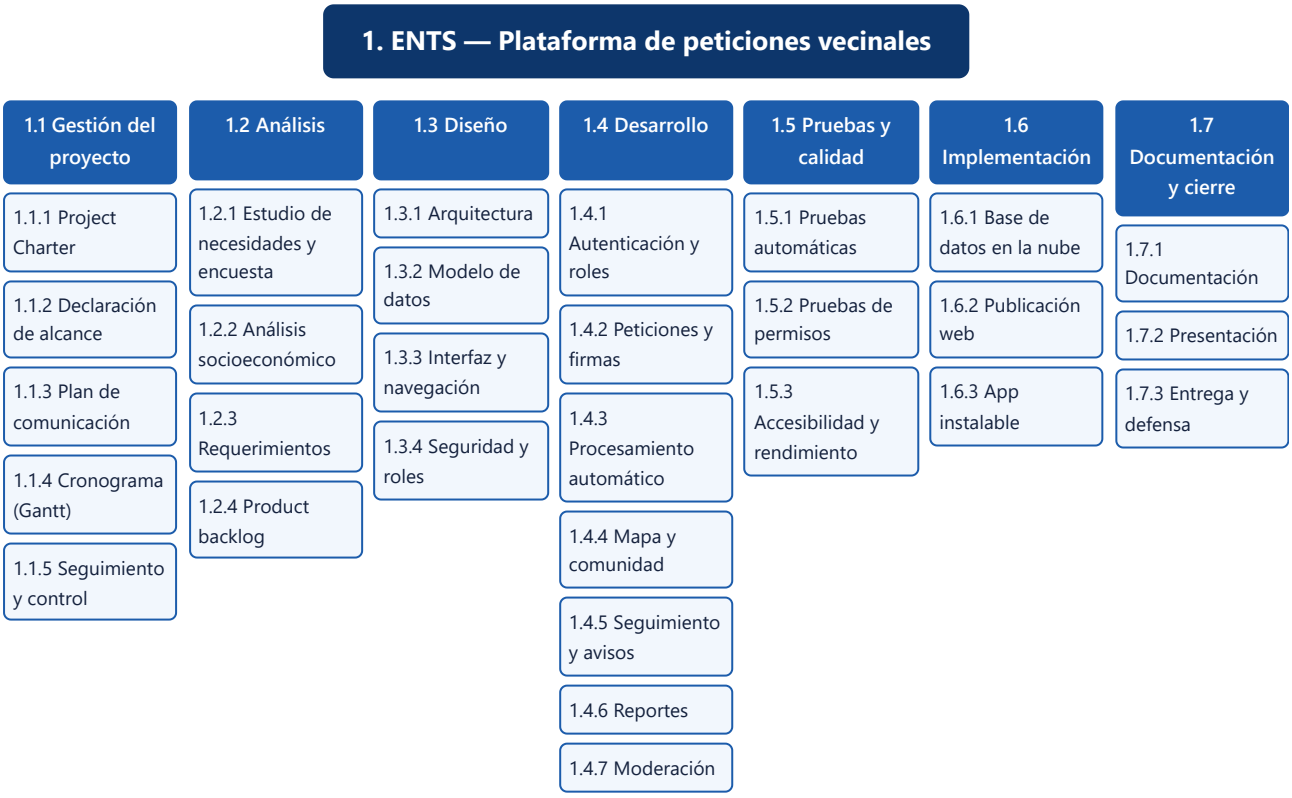


Figura 1. EDT del proyecto ENTS (tres niveles).

3. EDT en formato de lista

Código	Elemento	Descripción / entregable
1	**ENTS — Plataforma de peticiones vecinales**	Proyecto completo.
1.1	**Gestión del proyecto**	Planificación, coordinación y control.
1.1.1	Project Charter	Propuesta de reorientación aprobada; Project Charter y Declaración de alcance
1.1.2	Declaración de alcance	Project Charter y Declaración de alcance
1.1.3	Plan de comunicación	Plan de comunicación y cronograma base
1.1.4	Cronograma (Gantt)	Plan de comunicación y cronograma base
1.1.5	Seguimiento y control	—
1.2	**Análisis**	Comprensión del problema y de los requisitos.
1.2.1	Estudio de necesidades y encuesta	Informe de necesidades actualizado
1.2.2	Análisis socioeconómico	Informe de necesidades actualizado
1.2.3	Requerimientos	Requerimientos y product backlog priorizado
1.2.4	Product backlog	Requerimientos y product backlog priorizado
1.3	**Diseño**	Definición técnica y visual de la solución.
1.3.1	Arquitectura	Documento de arquitectura y despliegue
1.3.2	Modelo de datos	DER, esquema SQL y políticas de acceso
1.3.3	Interfaz y navegación	Prototipo de pantallas y estilo visual
1.3.4	Seguridad y roles	DER, esquema SQL y políticas de acceso
1.4	**Desarrollo**	Construcción de las funcionalidades.
1.4.1	Autenticación y roles	Módulo de cuentas y roles
1.4.2	Peticiones y firmas	Módulo de peticiones y moderación
1.4.3	Procesamiento automático	Procesamiento automático
1.4.4	Mapa y comunidad	Mapa, muro vecinal y agenda
1.4.5	Seguimiento y avisos	Seguimiento, avisos y comentarios
1.4.6	Reportes	Paneles y reportes Excel/PDF
1.4.7	Moderación	Módulo de peticiones y moderación
1.5	**Pruebas y calidad**	Verificación del producto.
1.5.1	Pruebas automáticas	Suite de pruebas y reporte de permisos
1.5.2	Pruebas de permisos	Suite de pruebas y reporte de permisos

Código	Elemento	Descripción / entregable
1.5.3	Accesibilidad y rendimiento	App instalable, accesible y fluida en celular
1.6	**Implementación**	Puesta en producción.
1.6.1	Base de datos en la nube	Repositorio, proyecto Supabase y sitio en Netlify
1.6.2	Publicación web	Repositorio, proyecto Supabase y sitio en Netlify
1.6.3	App instalable	App instalable, accesible y fluida en celular
1.7	**Documentación y cierre**	Documentos, presentación y entrega.
1.7.1	Documentación	Documentación del proyecto y entregables de gestión
1.7.2	Presentación	Presentación para la defensa
1.7.3	Entrega y defensa	Proyecto entregado y defendido

4. Relación con las actividades

Componente	Actividades
1.1 Gestión del proyecto	A1 Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto A2 Redactar Project Charter y declaración de alcance A3 Definir plan de comunicación y cronograma
1.2 Análisis	A4 Revisar encuesta y análisis socioeconómico A5 Relevar requerimientos y armar product backlog
1.3 Diseño	A6 Diseñar arquitectura y elegir tecnologías A7 Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad A8 Diseñar interfaz y navegación
1.4 Desarrollo	A10 Desarrollar autenticación, roles y anonimato A11 Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación A12 Desarrollar clasificación, barrio, score y similares A13 Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos A14 Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios A15 Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes
1.5 Pruebas y calidad	A16 Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol A17 Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento
1.6 Implementación	A9 Configurar repositorio, base de datos y publicación A17 Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento
1.7 Documentación y cierre	A18 Redactar documentación A19 Preparar presentación A20 Entrega y defensa

INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 4 DE 7

Lista de actividades

Actividades, duraciones, dependencias y ruta crítica del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-04
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Nueva lista de 20 actividades para el sistema de peticiones, con cálculo de ruta crítica.

Contenido

1. Convenciones
2. Lista de actividades
3. Resumen del cronograma
4. Ruta crítica

1. Convenciones

- **Duración:** días hábiles de trabajo del equipo.
- **Dependencias:** de tipo fin-comienzo (la actividad empieza cuando terminan todas sus predecesoras).
- **Inicio y fin:** día hábil relativo al comienzo del proyecto (día 0). Se convierten a fechas una vez fijada la fecha de inicio ([__/__/____]).
- **Holgura:** días que la actividad puede atrasarse sin atrasar el proyecto. Holgura 0 = actividad crítica.

2. Lista de actividades

ID	Actividad	EDT	Dur.	Predecesoras	Inicio	Fin	Holgura	Responsable
A1	Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto	1.1.1	3	—	0	3	0 · crítica	[asignar]
A2	Redactar Project Charter y declaración de alcance	1.1.1–1.1.2	3	A1	3	6	0 · crítica	[asignar]
A3	Definir plan de comunicación y cronograma	1.1.3–1.1.4	2	A2	6	8	2	[asignar]
A4	Revisar encuesta y análisis socioeconómico	1.2.1–1.2.2	3	A1	3	6	0 · crítica	[asignar]
A5	Relevar requerimientos y armar product backlog	1.2.3–1.2.4	4	A2, A4	6	10	0 · crítica	[asignar]
A6	Diseñar arquitectura y elegir tecnologías	1.3.1	3	A5, A3	10	13	0 · crítica	[asignar]
A7	Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad	1.3.2, 1.3.4	4	A6	13	17	0 · crítica	[asignar]
A8	Diseñar interfaz y navegación	1.3.3	4	A5	10	14	8	[asignar]
A9	Configurar repositorio, base de datos y publicación	1.6.1–1.6.2	2	A6	13	15	2	[asignar]
A10	Desarrollar autenticación, roles y anonimato	1.4.1	5	A7, A9	17	22	0 · crítica	[asignar]
A11	Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación	1.4.2, 1.4.7	6	A10, A8	22	28	0 · crítica	[asignar]
A12	Desarrollar clasificación, barrio, score y similares	1.4.3	5	A11	28	33	0 · crítica	[asignar]
A13	Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos	1.4.4	5	A11	28	33	0 · crítica	[asignar]

ID	Actividad	EDT	Dur.	Predecesoras	Inicio	Fin	Holgura	Responsable
A14	Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios	1.4.5	5	A11	28	33	4	[asignar]
A15	Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes	1.4.6	4	A12, A13	33	37	0 · crítica	[asignar]
A16	Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol	1.5.1–1.5.2	4	A12, A14, A15	37	41	0 · crítica	[asignar]
A17	Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento	1.5.3, 1.6.3	4	A15	37	41	0 · crítica	[asignar]
A18	Redactar documentación	1.7.1	5	A16, A17	41	46	0 · crítica	[asignar]
A19	Preparar presentación	1.7.2	2	A18	46	48	0 · crítica	[asignar]
A20	Entrega y defensa	1.7.3	1	A19	48	49	0 · crítica	[asignar]

3. Resumen del cronograma

Cantidad de actividades	20
Duración total del proyecto	49 días hábiles (≈ 10 semanas)
Esfuerzo total (suma de duraciones)	74 días-actividad
Actividades críticas	16 de 20

4. Ruta crítica

La ruta crítica es la secuencia de actividades sin holgura: cualquier atraso en ellas atrasa la entrega final.

A1 → A2 → A4 → A5 → A6 → A7 → A10 → A11 → A12 → A13 → A15 → A16 → A17 → A18 → A19 → A20

Las actividades fuera de la ruta crítica (A3 con 2 días, A8 con 8 días, A9 con 2 días, A14 con 4 días) pueden reprogramarse dentro de su holgura para equilibrar la carga del equipo.

> Completar la columna "Responsable" con el integrante a cargo de cada actividad.

INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 5 DE 7

Diccionario de actividades

Ficha detallada de cada actividad del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-05
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Nuevo diccionario con una ficha por cada una de las 20 actividades del sistema de peticiones.

Contenido

Cada ficha describe una actividad de la lista (Entregable 4): el paquete de la EDT al que pertenece, el entregable que produce, los recursos que usa, su duración y ubicación en el cronograma, sus dependencias y el criterio con el que se acepta como terminada.

Fichas de actividades

A1 · Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto	
Paquete de la EDT	1.1.1
Entregable	Propuesta de reorientación aprobada
Recursos	Equipo completo; documentación previa
Duración	3 días hábiles (día 0 a 3) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	— / A2, A4
Criterio de aceptación	El equipo y el docente acuerdan el nuevo enfoque
Responsable	[asignar]

A2 · Redactar Project Charter y declaración de alcance	
Paquete de la EDT	1.1.1–1.1.2
Entregable	Project Charter y Declaración de alcance
Recursos	Equipo; plantillas de gestión
Duración	3 días hábiles (día 3 a 6) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A1 / A3, A5
Criterio de aceptación	Documentos completos y aprobados por el docente
Responsable	[asignar]

A3 · Definir plan de comunicación y cronograma	
Paquete de la EDT	1.1.3–1.1.4
Entregable	Plan de comunicación y cronograma base
Recursos	Equipo
Duración	2 días hábiles (día 6 a 8) · holgura 2
Predecesoras / sucesoras	A2 / A6
Criterio de aceptación	Canales, frecuencias y responsables definidos
Responsable	[asignar]

A4 · Revisar encuesta y análisis socioeconómico	
Paquete de la EDT	1.2.1–1.2.2
Entregable	Informe de necesidades actualizado
Recursos	Resultados de la encuesta; análisis previo
Duración	3 días hábiles (día 3 a 6) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A1 / A5
Criterio de aceptación	Necesidades vinculadas a las categorías del sistema
Responsable	[asignar]

A5 · Relevar requerimientos y armar product backlog	
Paquete de la EDT	1.2.3–1.2.4
Entregable	Requerimientos y product backlog priorizado
Recursos	Equipo; tablero de tareas
Duración	4 días hábiles (día 6 a 10) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A2, A4 / A6, A8
Criterio de aceptación	Cada requerimiento trazable a una historia de usuario
Responsable	[asignar]

A6 · Diseñar arquitectura y elegir tecnologías	
Paquete de la EDT	1.3.1
Entregable	Documento de arquitectura y despliegue
Recursos	Equipo; documentación de las tecnologías
Duración	3 días hábiles (día 10 a 13) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A5, A3 / A7, A9
Criterio de aceptación	Cubre todos los requerimientos con servicios gratuitos
Responsable	[asignar]

A7 · Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad	
Paquete de la EDT	1.3.2, 1.3.4
Entregable	DER, esquema SQL y políticas de acceso
Recursos	Supabase; PostgreSQL
Duración	4 días hábiles (día 13 a 17) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A6 / A10
Criterio de aceptación	Esquema reproducible y reglas por rol definidas
Responsable	[asignar]

A8 · Diseñar interfaz y navegación	
Paquete de la EDT	1.3.3
Entregable	Prototipo de pantallas y estilo visual
Recursos	Editor de diseño; equipo
Duración	4 días hábiles (día 10 a 14) · holgura 8
Predecesoras / sucesoras	A5 / A11
Criterio de aceptación	Flujos principales aprobados por el equipo
Responsable	[asignar]

A9 · Configurar repositorio, base de datos y publicación	
Paquete de la EDT	1.6.1–1.6.2
Entregable	Repositorio, proyecto Supabase y sitio en Netlify
Recursos	GitHub; Supabase; Netlify
Duración	2 días hábiles (día 13 a 15) · holgura 2
Predecesoras / sucesoras	A6 / A10
Criterio de aceptación	Cada cambio en la rama principal se publica solo
Responsable	[asignar]

A10 · Desarrollar autenticación, roles y anonimato	
Paquete de la EDT	1.4.1
Entregable	Módulo de cuentas y roles
Recursos	React; Supabase Auth
Duración	5 días hábiles (día 17 a 22) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A7, A9 / A11
Criterio de aceptación	Registro, ingreso con Google, recuperación y roles operativos
Responsable	[asignar]

A11 · Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación	
Paquete de la EDT	1.4.2, 1.4.7
Entregable	Módulo de peticiones y moderación
Recursos	React; Supabase; Storage
Duración	6 días hábiles (día 22 a 28) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A10, A8 / A12, A13, A14
Criterio de aceptación	Alta con fotos y ubicación; una firma por persona; moderación previa
Responsable	[asignar]

A12 · Desarrollar clasificación, barrio, score y similares	
Paquete de la EDT	1.4.3
Entregable	Procesamiento automático
Recursos	PostgreSQL (pg_trgm); OpenStreetMap
Duración	5 días hábiles (día 28 a 33) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A11 / A15, A16
Criterio de aceptación	Casos de prueba de cada algoritmo resueltos correctamente
Responsable	[asignar]

A13 · Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos	
Paquete de la EDT	1.4.4
Entregable	Mapa, muro vecinal y agenda
Recursos	Leaflet; OpenStreetMap
Duración	5 días hábiles (día 28 a 33) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A11 / A15
Criterio de aceptación	Filtros por barrio operativos en las tres pantallas
Responsable	[asignar]

A14 · Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios	
Paquete de la EDT	1.4.5
Entregable	Seguimiento, avisos y comentarios
Recursos	Supabase (disparadores y funciones)
Duración	5 días hábiles (día 28 a 33) · holgura 4
Predecesoras / sucesoras	A11 / A16
Criterio de aceptación	Cada cambio de etapa notifica a autor y firmantes
Responsable	[asignar]

A15 · Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes	
Paquete de la EDT	1.4.6
Entregable	Paneles y reportes Excel/PDF
Recursos	React; funciones de estadísticas
Duración	4 días hábiles (día 33 a 37) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A12, A13 / A16, A17
Criterio de aceptación	Los datos de los paneles coinciden con la base
Responsable	[asignar]

A16 · Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol	
Paquete de la EDT	1.5.1–1.5.2
Entregable	Suite de pruebas y reporte de permisos
Recursos	Vitest; consultas por rol
Duración	4 días hábiles (día 37 a 41) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A12, A14, A15 / A18
Criterio de aceptación	100% de las pruebas aprobadas
Responsable	[asignar]

A17 · Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento	
Paquete de la EDT	1.5.3, 1.6.3
Entregable	App instalable, accesible y fluida en celular
Recursos	Service worker; manifiesto; CSS
Duración	4 días hábiles (día 37 a 41) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A15 / A18
Criterio de aceptación	Navegable con teclado; instalable; sin animaciones pesadas en celular
Responsable	[asignar]

A18 · Redactar documentación	
Paquete de la EDT	1.7.1
Entregable	Documentación del proyecto y entregables de gestión
Recursos	Equipo
Duración	5 días hábiles (día 41 a 46) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A16, A17 / A19
Criterio de aceptación	Cumple la estructura exigida por la cátedra
Responsable	[asignar]

A19 · Preparar presentación	
Paquete de la EDT	1.7.2
Entregable	Presentación para la defensa
Recursos	Equipo
Duración	2 días hábiles (día 46 a 48) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A18 / A20
Criterio de aceptación	Ensayada y dentro del tiempo asignado
Responsable	[asignar]

A20 · Entrega y defensa	
Paquete de la EDT	1.7.3
Entregable	Proyecto entregado y defendido
Recursos	Equipo completo
Duración	1 días hábiles (día 48 a 49) · holgura 0 · **crítica**
Predecesoras / sucesoras	A19 / —
Criterio de aceptación	Aprobación del docente
Responsable	[asignar]

INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 6 DE 7

Plan de comunicación

Gestión de las comunicaciones del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-06
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Nuevo plan de comunicación con interesados, matriz de comunicaciones, reuniones, escalamiento y plantilla de minuta.

Contenido

1. Objetivo
2. Interesados
3. Matriz de poder e interés
4. Matriz de comunicaciones
5. Reuniones
6. Canales y herramientas
7. Flujo de la comunicación
8. Escalamiento y gestión de cambios
9. Convenciones del equipo
10. Plantilla de minuta

1. Objetivo

Asegurar que cada interesado reciba la información que necesita, en el momento oportuno y por el canal adecuado, para que el equipo trabaje coordinado, la cátedra conozca el avance y, en la operación de la plataforma, vecinos, funcionarios y organismos estén informados del estado de cada petición.

2. Interesados

Interesado	Necesidad de información	Poder	Interés	Estrategia
Docente (Ing. Loza)	Avance, cambios de alcance, entregables	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Equipo de proyecto	Tareas, bloqueos, decisiones técnicas	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Áreas del municipio / funcionarios	Peticiones de su área, prioridad, elevaciones	Alto	Medio	Mantener satisfechos
Vecinos	Estado de sus peticiones y de su barrio	Bajo	Alto	Mantener informados
ONG y organizaciones sociales	Reportes por zona y urgencia	Bajo	Medio	Mantener informados
Instituto Cervantes	Resultados del proyecto	Medio	Bajo	Monitorear

3. Matriz de poder e interés



4. Matriz de comunicaciones

Qué se comunica	Emisor	Receptor	Canal	Frecuencia	Formato
Avance y bloqueos	Cada integrante	Equipo	Reunión breve + mensajería	[frecuencia]	Oral / mensaje
Planificación del sprint	Director	Equipo	Reunión + tablero de tareas	Inicio de sprint	Backlog priorizado
Cambios de código	Integrante	Equipo	GitHub: rama + Pull Request	Por cambio	Descripción del PR
Publicación de versiones	Director	Equipo	Netlify (automática) + aviso	Por versión	Mensaje con el resumen
Revisión del sprint	Equipo	Docente	Clase / demostración	Fin de sprint	Demo del sitio
Cambios de alcance	Director	Docente	Reunión + documento	Cuando ocurren	Pedido de cambio
Entregables de gestión	Equipo	Docente	PDF	Según calendario	Documento
Estado de las peticiones	Plataforma	Vecinos	Notificaciones en la app	Automática	Aviso
Respuestas oficiales	Funcionarios	Vecinos	Seguimiento de la petición	Por actualización	Mensaje + foto
Peticiones elevadas	Plataforma	Funcionarios	Notificación + bandeja	Al llegar a 50 firmas	Aviso
Reportes de problemáticas	Administración	Organismos / ONG	Exportes Excel / PDF	[periodicidad]	Reporte

5. Reuniones

Reunión	Propósito	Participantes	Frecuencia	Duración
Seguimiento	Qué hice, qué voy a hacer, qué me bloquea	Equipo	[frecuencia]	15 min
Planificación de sprint	Elegir y repartir tareas del backlog	Equipo	Inicio de sprint	45 min
Revisión de sprint	Mostrar lo terminado y recibir devoluciones	Equipo y docente	Fin de sprint	30 min
Retrospectiva	Qué mejorar en la forma de trabajo	Equipo	Fin de sprint	20 min

6. Canales y herramientas

Canal	Uso
[grupo de mensajería]	Coordinación diaria, avisos rápidos y bloqueos.
GitHub	Código, Pull Requests, revisión entre integrantes e historial de cambios.
[tablero de tareas]	Product backlog, tareas del sprint y estado de cada una.
[videollamada / presencial]	Reuniones de planificación, seguimiento y retrospectiva.
Plataforma ENTS	Comunicación con vecinos y funcionarios: notificaciones, seguimiento y comentarios.
Correo electrónico	Comunicaciones formales con el docente y entrega de documentos.

7. Flujo de la comunicación

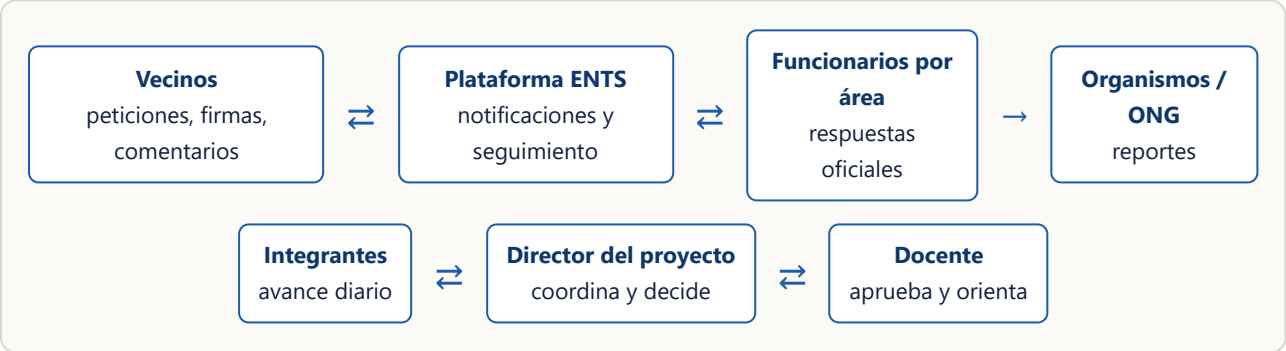


Figura 1. Flujo de la comunicación del proyecto (abajo) y de la plataforma en operación (arriba).

8. Escalamiento y gestión de cambios

1. **Nivel 1 — Integrante:** resuelve el problema dentro de su tarea; si no puede en 1 día, lo avisa en el grupo.
2. **Nivel 2 — Equipo / director:** se trata en la reunión de seguimiento; el director redistribuye tareas o ajusta prioridades.
3. **Nivel 3 — Docente:** los cambios de alcance, de fechas de entrega o los riesgos críticos se presentan al docente con su impacto.

9. Convenciones del equipo

- **Ramas:** la rama principal (`main`) es la versión publicada; cada cambio se hace en una rama propia y se integra con Pull Request.
- **Mensajes de commit:** en español, en presente y describiendo el cambio (por ejemplo, "Score de urgencia calculado automáticamente").
- **Antes de integrar:** revisión de código, pruebas automáticas y compilación sin errores.

- **Documentos:** cada modificación se registra en el historial de revisión con autor, fecha y hora.

10. Plantilla de minuta de reunión

Fecha y hora	
Tipo de reunión	Seguimiento / Planificación / Revisión / Retrospectiva
Participantes	
Temas tratados	
Decisiones	
Tareas (qué · quién · para cuándo)	
Próxima reunión	

INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 7 DE 7

Diagrama de Gantt

Cronograma del proyecto ENTS con ruta crítica e hitos

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-07
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión


Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Nuevo cronograma de 49 días hábiles (10 semanas) calculado a partir de la lista de actividades, con ruta crítica e hitos.

Contenido

1. Diagrama de Gantt
2. Hitos
3. Ruta crítica
4. Conversión a fechas

1. Diagrama de Gantt

Cada barra representa una actividad de la lista (Entregable 4), ubicada según sus dependencias. Escala: semanas de 5 días hábiles desde el inicio del proyecto.

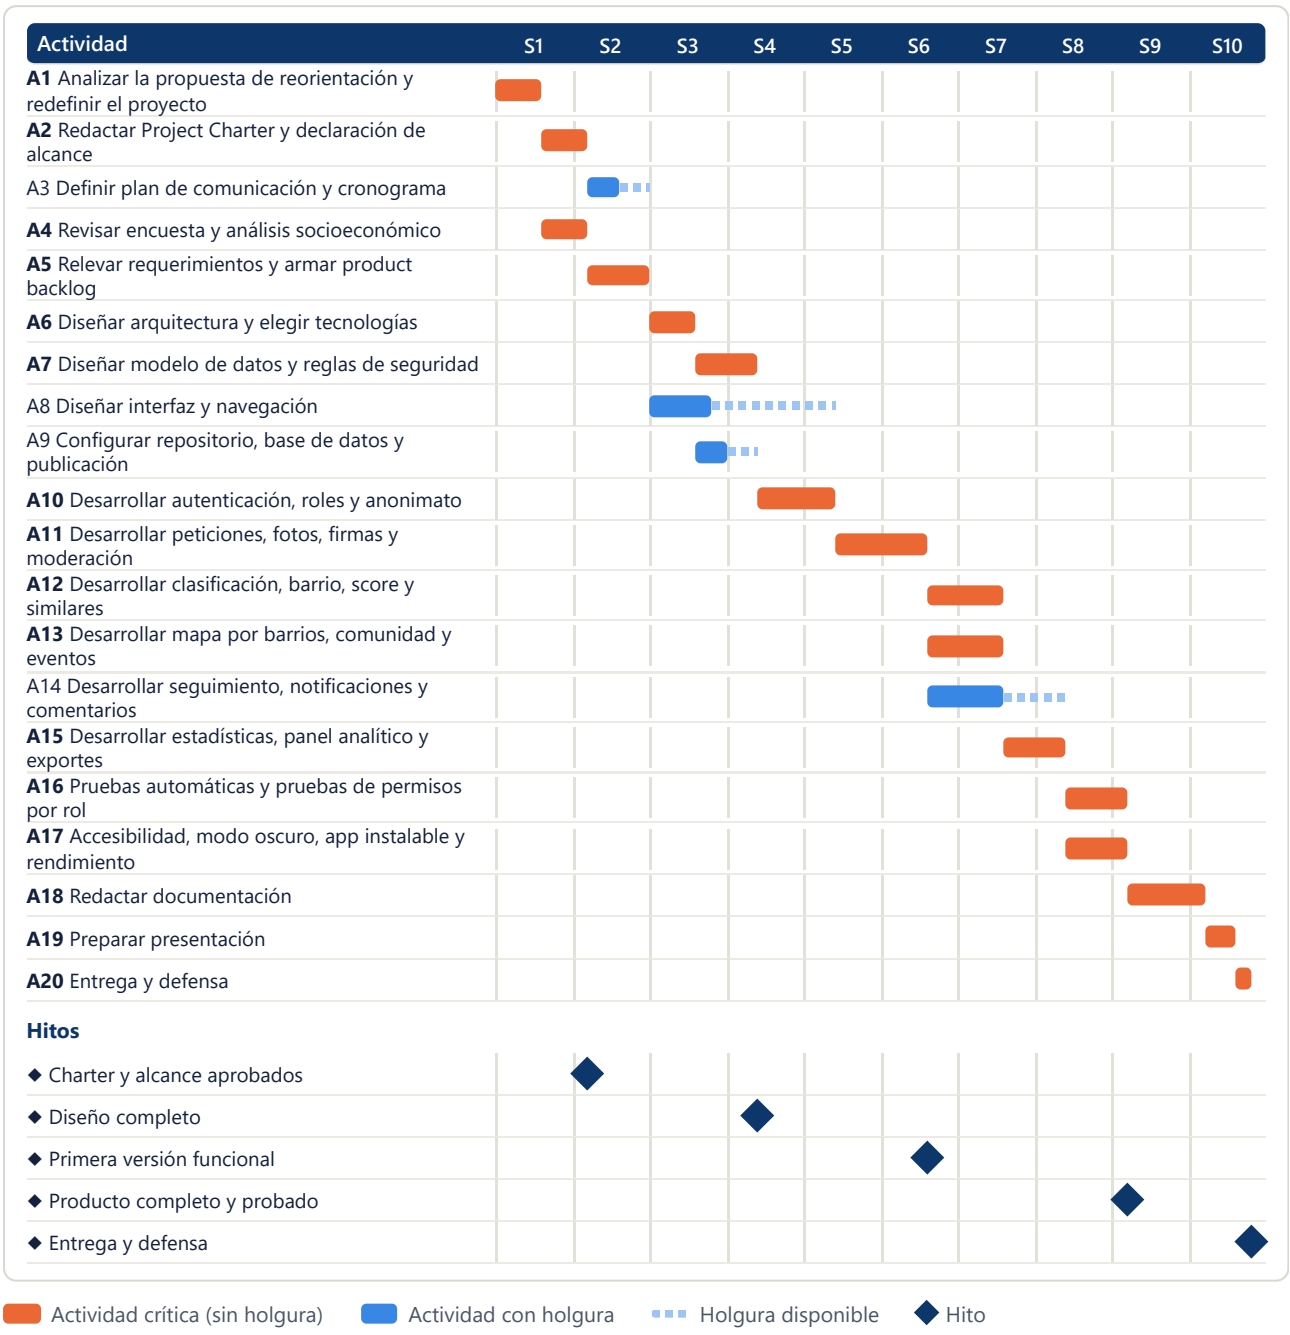

2. Hitos

Hito	Día hábil	Semana	Fecha
Charter y alcance aprobados	6	S2	[__/__/____]
Diseño completo	17	S4	[__/__/____]
Primera versión funcional	28	S6	[__/__/____]

Hito	Día hábil	Semana	Fecha
Producto completo y probado	41	S9	[__/__/____]
Entrega y defensa	49	S10	[__/__/____]

3. Ruta crítica

A1 → A2 → A4 → A5 → A6 → A7 → A10 → A11 → A12 → A13 → A15 → A16 → A17 → A18 → A19 → A20

Duración total: **49 días hábiles** (≈ 10 semanas). Un atraso en cualquiera de estas actividades atrasa la entrega. Las demás tienen holgura: A3 (2 días), A8 (8 días), A9 (2 días), A14 (4 días).

4. Conversión a fechas

Al fijar la fecha de inicio del proyecto ([__/__/____]), cada día hábil se convierte sumando días laborables (sin fines de semana ni feriados). Las versiones del sistema registradas en el repositorio son: primera versión funcional el 04/10/2026; roles, anonimato e ingreso con Google el 11/10/2026; procesamiento automático, seguimiento, reportes y calidad el 12/10/2026.
