INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 3 DE 7

EDT / WBS

Estructura de desglose del trabajo del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-03
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Nueva EDT orientada a entregables para el sistema de peticiones vecinales (7 componentes, 29 paquetes de trabajo).

Contenido

1. Criterios de construcción
2. Diagrama de la EDT
3. EDT en formato de lista
4. Relación con las actividades

1. Criterios de construcción

- **Orientada a entregables:** cada elemento representa un resultado verificable, no una tarea suelta.
- **Regla del 100%:** la EDT incluye todo el trabajo del proyecto y nada que esté fuera del alcance aprobado.
- **Tres niveles:** proyecto (nivel 1), componentes (nivel 2) y paquetes de trabajo (nivel 3).
- **Codificación jerárquica:** cada paquete se identifica con un código (por ejemplo, 1.4.3) que se usa en la lista y el diccionario de actividades.

Componentes (nivel 2)	7
Paquetes de trabajo (nivel 3)	29
Actividades asociadas	20 (ver Entregable 4)

2. Diagrama de la EDT

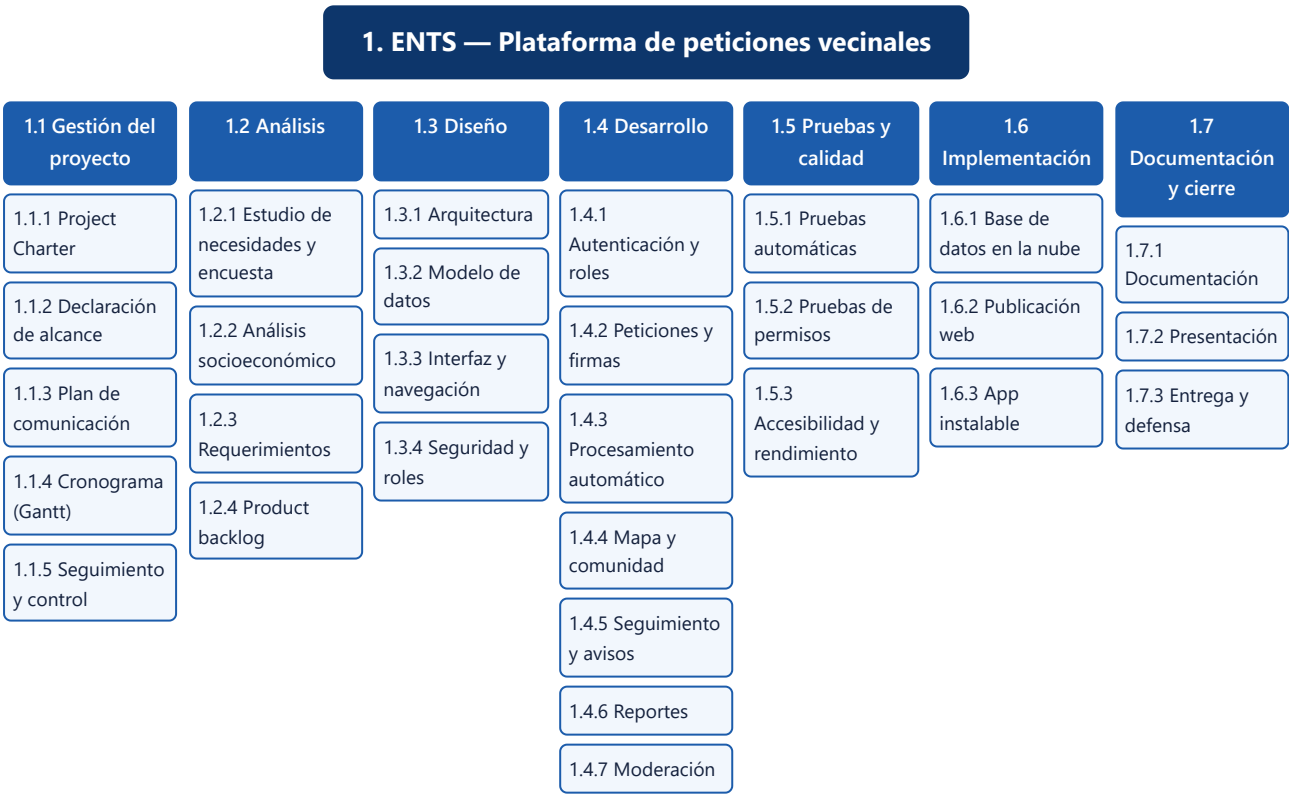


Figura 1. EDT del proyecto ENTS (tres niveles).

3. EDT en formato de lista

Código	Elemento	Descripción / entregable
1	**ENTS — Plataforma de peticiones vecinales**	Proyecto completo.
1.1	**Gestión del proyecto**	Planificación, coordinación y control.
1.1.1	Project Charter	Propuesta de reorientación aprobada; Project Charter y Declaración de alcance
1.1.2	Declaración de alcance	Project Charter y Declaración de alcance
1.1.3	Plan de comunicación	Plan de comunicación y cronograma base
1.1.4	Cronograma (Gantt)	Plan de comunicación y cronograma base
1.1.5	Seguimiento y control	—
1.2	**Análisis**	Comprensión del problema y de los requisitos.
1.2.1	Estudio de necesidades y encuesta	Informe de necesidades actualizado
1.2.2	Análisis socioeconómico	Informe de necesidades actualizado
1.2.3	Requerimientos	Requerimientos y product backlog priorizado
1.2.4	Product backlog	Requerimientos y product backlog priorizado
1.3	**Diseño**	Definición técnica y visual de la solución.
1.3.1	Arquitectura	Documento de arquitectura y despliegue
1.3.2	Modelo de datos	DER, esquema SQL y políticas de acceso
1.3.3	Interfaz y navegación	Prototipo de pantallas y estilo visual
1.3.4	Seguridad y roles	DER, esquema SQL y políticas de acceso
1.4	**Desarrollo**	Construcción de las funcionalidades.
1.4.1	Autenticación y roles	Módulo de cuentas y roles
1.4.2	Peticiones y firmas	Módulo de peticiones y moderación
1.4.3	Procesamiento automático	Procesamiento automático
1.4.4	Mapa y comunidad	Mapa, muro vecinal y agenda
1.4.5	Seguimiento y avisos	Seguimiento, avisos y comentarios
1.4.6	Reportes	Paneles y reportes Excel/PDF
1.4.7	Moderación	Módulo de peticiones y moderación
1.5	**Pruebas y calidad**	Verificación del producto.
1.5.1	Pruebas automáticas	Suite de pruebas y reporte de permisos
1.5.2	Pruebas de permisos	Suite de pruebas y reporte de permisos

Código	Elemento	Descripción / entregable
1.5.3	Accesibilidad y rendimiento	App instalable, accesible y fluida en celular
1.6	**Implementación**	Puesta en producción.
1.6.1	Base de datos en la nube	Repositorio, proyecto Supabase y sitio en Netlify
1.6.2	Publicación web	Repositorio, proyecto Supabase y sitio en Netlify
1.6.3	App instalable	App instalable, accesible y fluida en celular
1.7	**Documentación y cierre**	Documentos, presentación y entrega.
1.7.1	Documentación	Documentación del proyecto y entregables de gestión
1.7.2	Presentación	Presentación para la defensa
1.7.3	Entrega y defensa	Proyecto entregado y defendido

4. Relación con las actividades

Componente	Actividades
1.1 Gestión del proyecto	A1 Analizar la propuesta de reorientación y redefinir el proyecto A2 Redactar Project Charter y declaración de alcance A3 Definir plan de comunicación y cronograma
1.2 Análisis	A4 Revisar encuesta y análisis socioeconómico A5 Relevar requerimientos y armar product backlog
1.3 Diseño	A6 Diseñar arquitectura y elegir tecnologías A7 Diseñar modelo de datos y reglas de seguridad A8 Diseñar interfaz y navegación
1.4 Desarrollo	A10 Desarrollar autenticación, roles y anonimato A11 Desarrollar peticiones, fotos, firmas y moderación A12 Desarrollar clasificación, barrio, score y similares A13 Desarrollar mapa por barrios, comunidad y eventos A14 Desarrollar seguimiento, notificaciones y comentarios A15 Desarrollar estadísticas, panel analítico y exportes
1.5 Pruebas y calidad	A16 Pruebas automáticas y pruebas de permisos por rol A17 Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento
1.6 Implementación	A9 Configurar repositorio, base de datos y publicación A17 Accesibilidad, modo oscuro, app instalable y rendimiento
1.7 Documentación y cierre	A18 Redactar documentación A19 Preparar presentación A20 Entrega y defensa
