INSTITUTO CERVANTES

Carrera: [completar] · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 7 DE 7

Diagrama de Gantt

Cronograma del proyecto ENTS con ruta crítica e hitos

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba
Docente	Ing. Loza
Código del documento	ENTS-GP-07
Versión	2.0
Fecha de entrega	[__/__/____]

Autores

Jiménez, Ignacio	Legajo 28177
Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311

Historial de revisión


Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	[fecha] [hh:mm]	Equipo	Versión original del proyecto de donaciones solidarias.
2.0	12/10/2026 [hh:mm]	Andrada, Juan Pablo	Nuevo cronograma de 49 días hábiles (10 semanas) calculado a partir de la lista de actividades, con ruta crítica e hitos.

Contenido

1. Diagrama de Gantt
2. Hitos
3. Ruta crítica
4. Conversión a fechas

1. Diagrama de Gantt

Cada barra representa una actividad de la lista (Entregable 4), ubicada según sus dependencias. Escala: semanas de 5 días hábiles desde el inicio del proyecto.

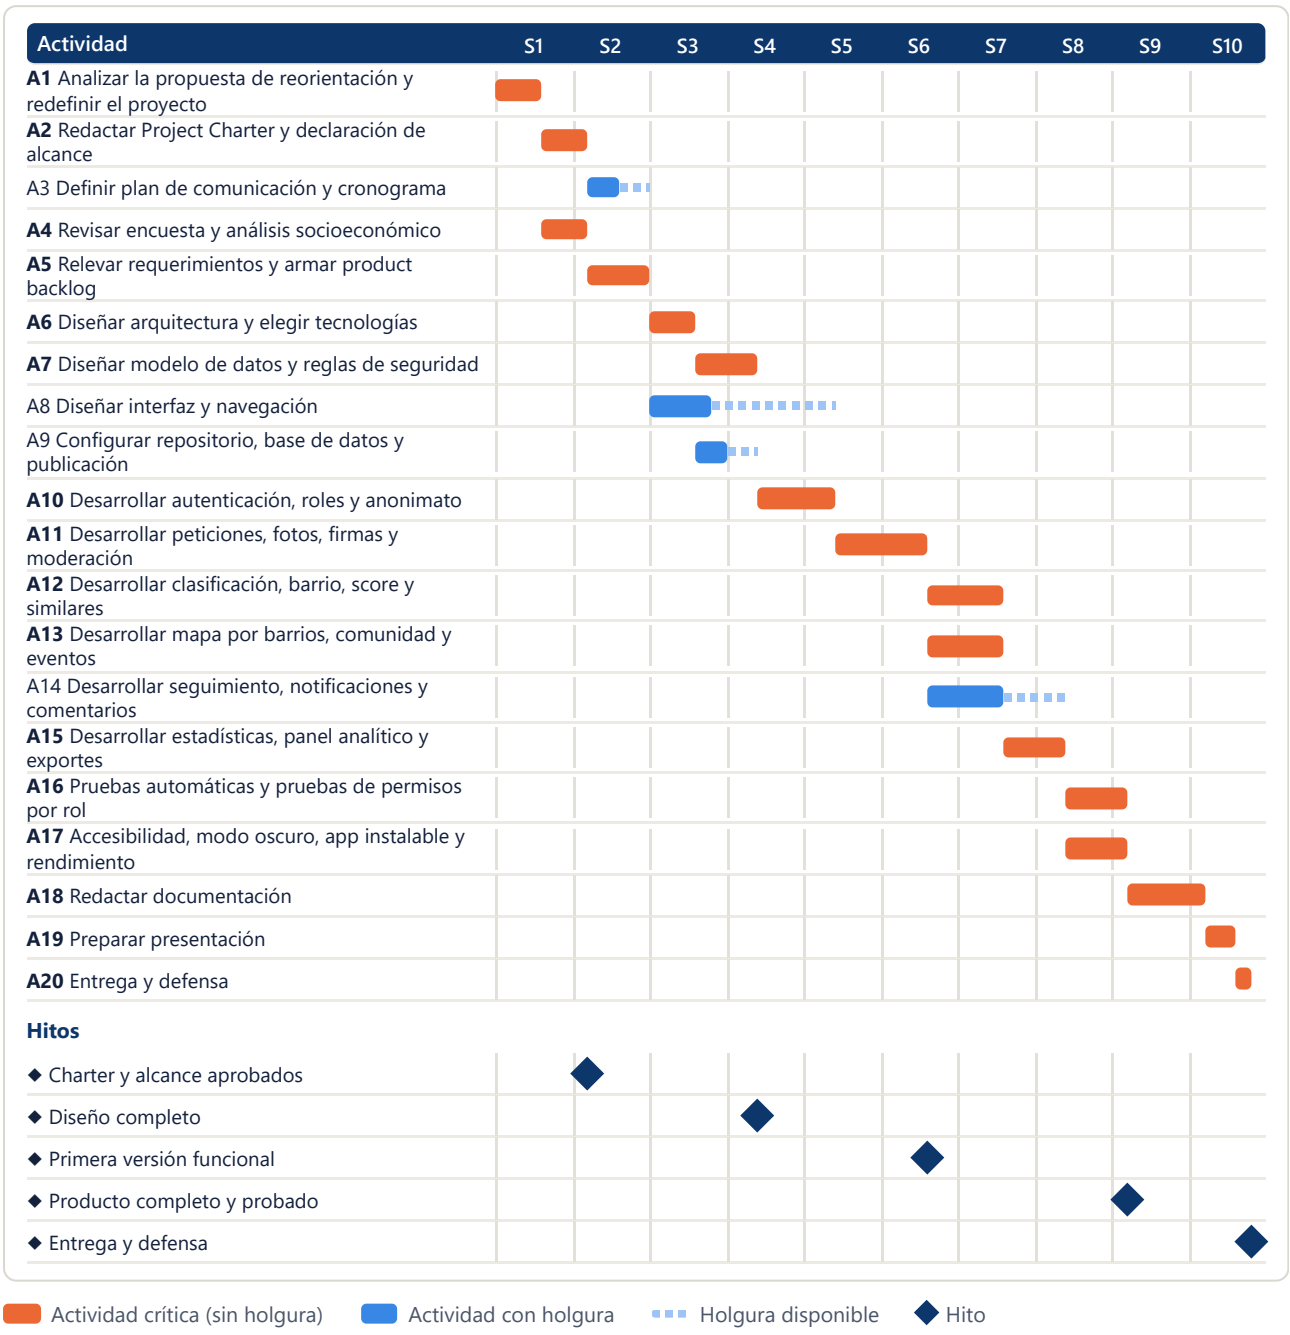

2. Hitos

Hito	Día hábil	Semana	Fecha
Charter y alcance aprobados	6	S2	[__/__/____]
Diseño completo	17	S4	[__/__/____]
Primera versión funcional	28	S6	[__/__/____]

Hito	Día hábil	Semana	Fecha
Producto completo y probado	41	S9	[__/__/____]
Entrega y defensa	49	S10	[__/__/____]

3. Ruta crítica

A1 → A2 → A4 → A5 → A6 → A7 → A10 → A11 → A12 → A13 → A15 → A16 → A17 → A18 → A19 → A20

Duración total: **49 días hábiles** (≈ 10 semanas). Un atraso en cualquiera de estas actividades atrasa la entrega. Las demás tienen holgura: A3 (2 días), A8 (8 días), A9 (2 días), A14 (4 días).

4. Conversión a fechas

Al fijar la fecha de inicio del proyecto ([__/__/____]), cada día hábil se convierte sumando días laborables (sin fines de semana ni feriados). Las versiones del sistema registradas en el repositorio son: primera versión funcional el 04/10/2026; roles, anonimato e ingreso con Google el 11/10/2026; procesamiento automático, seguimiento, reportes y calidad el 12/10/2026.
