INSTITUTO CERVANTES

Carrera Analista Programador · Cátedra Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 7 DE 7

Diagrama de Gantt

Cronograma del proyecto ENTS con sprints, ruta crítica e hitos

PROYECTO	DOCENTE	DIRECTOR DEL PROYECTO
ENTS — Peticiones vecinales	Ing. Loza	Andrada, Juan Pablo

CÓDIGO	VERSIÓN	SITIO PUBLICADO
ENTS-GP-07	4.0	entscordoba.netlify.app

AUTORES

Andrada, Juan Pablo
Legajo 27318

Patrón, Máximo
Legajo 27311

Jiménez, Ignacio
Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Nuevo cronograma de 49 días hábiles (10 semanas) calculado a partir de la lista de actividades, con ruta crítica e hitos.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Se agregan sprints y responsables al diagrama.
4.0	18/10/2026 16:10	Andrada, Juan Pablo	Barrio del vecino: cada cuenta elige dónde vive y ve primero lo de su barrio (requisitos RF21 y RF22, historia HU14 y nuevos términos del glosario). Se registran los datos de demostración y la limpieza del código.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

G Glosario
1 Cómo leer el diagrama
2 Diagrama de Gantt
3 Sprints
4 Hitos
5 Ruta crítica
6 Conversión a fechas

GUÍA DE LECTURA

Qué es este documento. El diagrama de Gantt muestra el cronograma del proyecto: cada actividad es una barra ubicada en el tiempo según su duración y sus dependencias.

Para qué sirve. Permite ver de un vistazo qué se hace en cada semana, qué actividades ocurren en paralelo, cuáles son críticas y cuánta holgura tienen las demás.

Relación con los demás entregables. Se calcula automáticamente a partir de la lista de actividades (Entregable 4): las mismas duraciones, dependencias y responsables. Los hitos coinciden con los del Project Charter (Entregable 1).

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Accesibilidad	Posibilidad de que cualquier persona, incluso con discapacidad, use el sistema (teclado, contraste, lectores de pantalla).
Actividad	Trabajo concreto que produce un entregable. Se identifica con un código A1, A2…
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Barrio del vecino (mi barrio)	Barrio donde vive cada vecino, elegido por él mismo. Ordena lo que ve primero en la plataforma y solo se muestra a otros si la persona lo permite.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.


Término	Significado
Datos de demostración	Cuentas, peticiones y fotos ficticias cargadas para mostrar la plataforma con actividad; se identifican con el dominio demo.ents.invalid y se borran con un solo script.
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.
Diagrama de Gantt	Gráfico que muestra cada actividad como una barra a lo largo del tiempo.
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
Geolocalización	Obtención de la ubicación del dispositivo (con permiso de la persona) para completar el barrio automáticamente.
Hito	Momento clave del proyecto sin duración (por ejemplo, "primera versión funcional"). Se dibuja con un rombo.
Holgura	Días que una actividad puede atrasarse sin atrasar la fecha de fin del proyecto.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Modo oscuro	Esquema de colores con fondo oscuro que reduce el brillo de la pantalla.
OAuth	Protocolo que permite ingresar con una cuenta de otro servicio (en ENTS, Google) sin compartir la contraseña.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).

Término	Significado
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
PWA	Progressive Web App (aplicación web progresiva): sitio web que se puede instalar en el celular y abrir como una aplicación.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
RF	Requisito funcional: algo que el sistema debe hacer (por ejemplo, "crear peticiones con fotos"). Se numeran RF01, RF02…
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Ruta crítica	Secuencia de actividades sin holgura: si una se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0, 4.0).

1 Cómo leer el diagrama

- **Eje horizontal:** tiempo, en semanas de 5 días hábiles (S1 a S10), agrupadas en 5 sprints de 2 semanas.
- **Cada fila:** una actividad con su código, nombre y responsable.
- **Barra naranja:** actividad crítica; si se atrasa, se atrasa todo el proyecto.
- **Barra azul:** actividad con holgura; la línea punteada a su derecha muestra cuántos días puede atrasarse.
- **Rombo:** hito, un momento clave sin duración.

2 Diagrama de Gantt

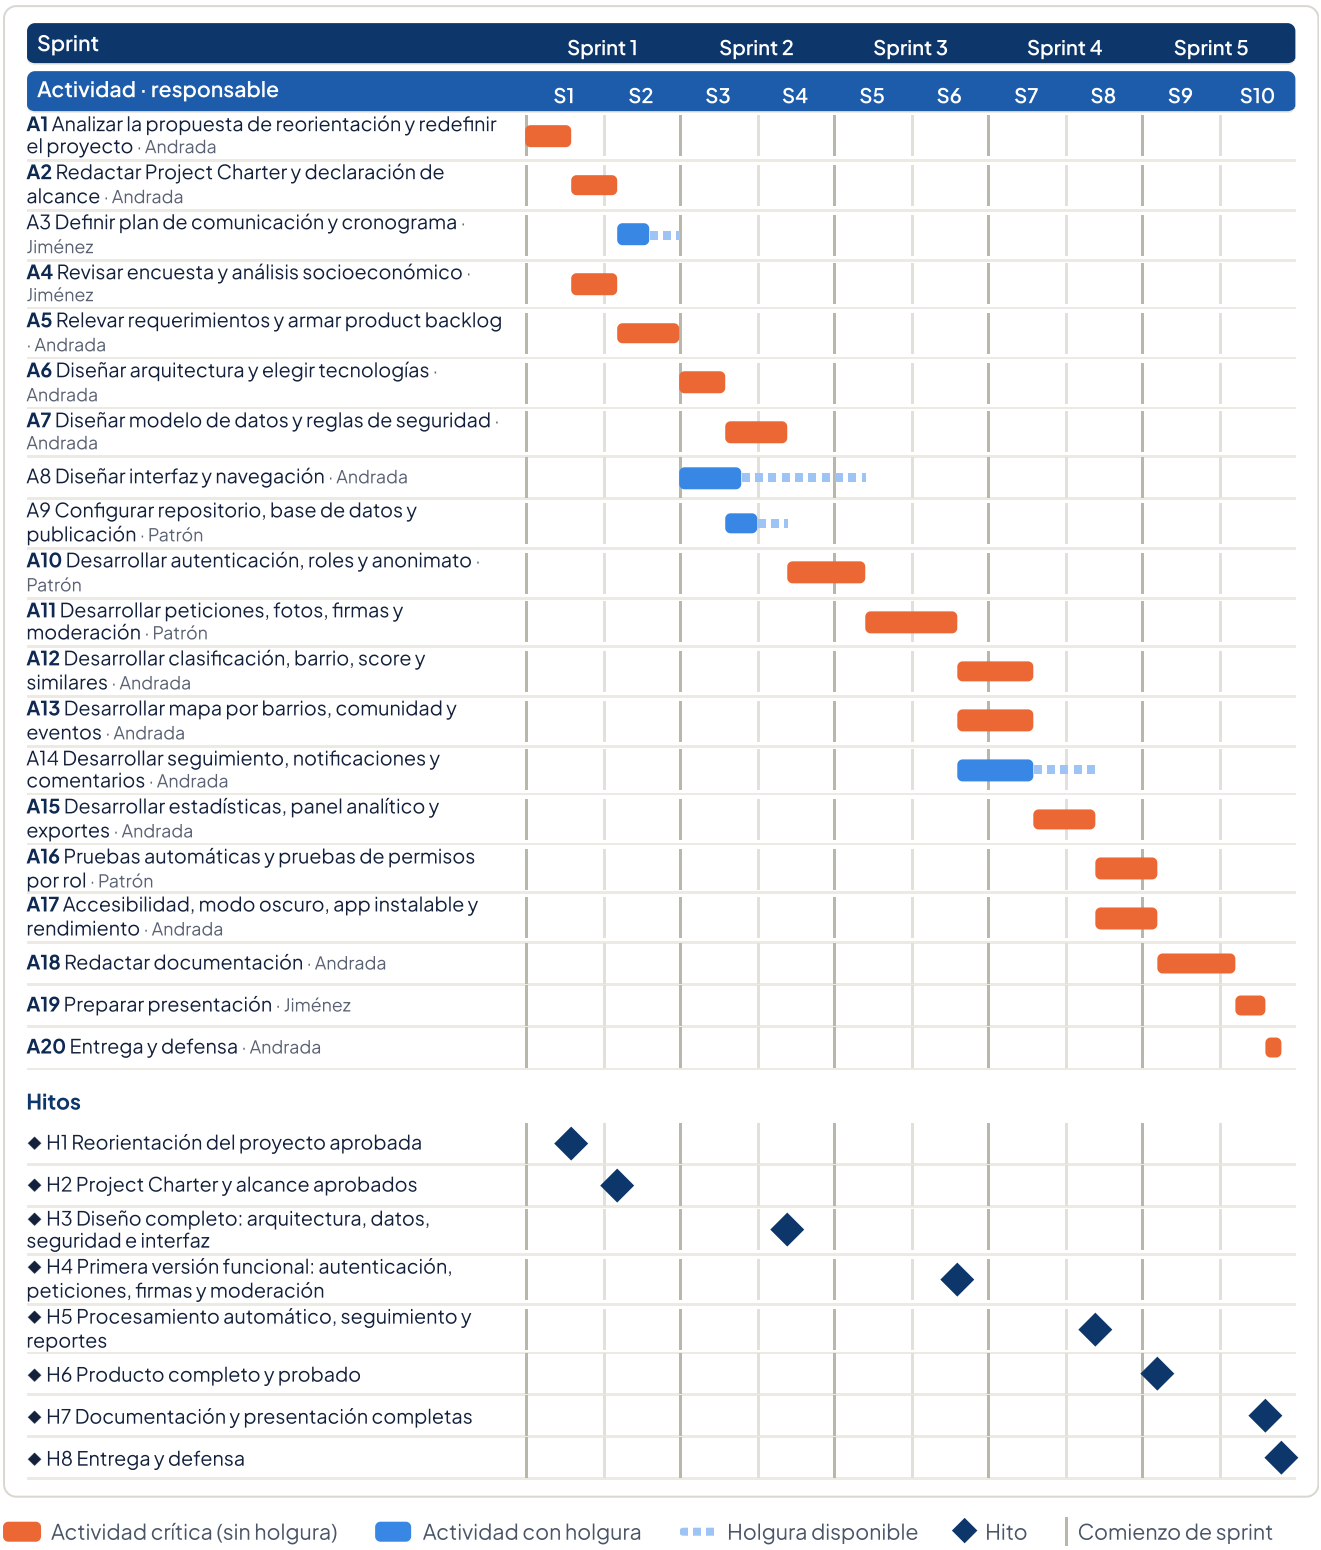

3 Sprints

Sprint	Días hábiles	Semanas	Actividades que se trabajan
Sprint 1	1 a 10	S1–S2	A1, A2, A3, A4, A5
Sprint 2	11 a 20	S3–S4	A6, A7, A8, A9, A10
Sprint 3	21 a 30	S5–S6	A10, A11, A12, A13, A14
Sprint 4	31 a 40	S7–S8	A12, A13, A14, A15, A16, A17
Sprint 5	41 a 49	S9–S10	A16, A17, A18, A19, A20

4 Hitos

Hito	Día hábil	Semana	Estado
H1 Reorientación del proyecto aprobada	3	S1	Cumplido
H2 Project Charter y alcance aprobados	6	S2	Cumplido (versión 2.0 de los entregables)
H3 Diseño completo: arquitectura, datos, seguridad e interfaz	17	S4	Cumplido
H4 Primera versión funcional: autenticación, peticiones, firmas y moderación	28	S6	Cumplido el 04/10/2026
H5 Procesamiento automático, seguimiento y reportes	37	S8	Cumplido el 12/10/2026
H6 Producto completo y probado	41	S9	Cumplido el 12/10/2026
H7 Documentación y presentación completas	48	S10	Cumplido (versión 4.0)
H8 Entrega y defensa	49	S10	Pendiente: fecha a definir por la cátedra

5 Ruta crítica

A1 → A2 → A4 → A5 → A6 → A7 → A10 → A11 → A12 → A13 → A15 → A16 → A17 → A18 → A19 → A20

Duración total: **49 días hábiles** (≈ 10 semanas). Un atraso en cualquiera de estas actividades atrasa la entrega. Las demás tienen holgura: A3 (2 días), A8 (8 días), A9 (2 días), A14 (4 días).

6 Conversión a fechas

El cronograma se expresa en días hábiles relativos porque la fecha de defensa todavía no fue fijada por la cátedra. Una vez confirmada, la fecha de inicio se obtiene contando 49 días hábiles hacia atrás desde la defensa, y cada día del diagrama se convierte sumando días laborables a esa fecha de inicio (sin contar fines de semana ni feriados).

Como referencia del avance real, el repositorio registra estas versiones del sistema: primera versión funcional el 04/10/2026; panel vecinal, roles, anonimato e ingreso con Google el 11/10/2026; procesamiento automático, seguimiento, reportes, calidad y permisos por panel el 12/10/2026; datos de demostración, inicio y moderación más compactos, barrio del vecino y limpieza del código el 18/10/2026.
