INSTITUTO CERVANTES

Carrera: Analista Programador · Cátedra: Práctica Profesionalizante

ENTREGABLE 6 DE 7

Plan de comunicación

Gestión de las comunicaciones del proyecto ENTS

Proyecto	ENTS — Plataforma de peticiones vecinales de Córdoba y Villa Allende
Docente	Ing. Loza
Director del proyecto	Andrada, Juan Pablo
Código del documento	ENTS-GP-06
Versión	3.0
Sitio publicado	entscordoba.netlify.app

Autores

Andrada, Juan Pablo	Legajo 27318
Patrón, Máximo	Legajo 27311
Jiménez, Ignacio	Legajo 28177

Historial de revisión

Versión	Fecha y hora	Autor	Modificación
1.0	Sprint 0 (*)	Equipo	Versión original, para la propuesta de plataforma solidaria de donaciones.
2.0	12/10/2026 16:41	Andrada, Juan Pablo	Nuevo plan de comunicación con interesados, matriz de comunicaciones, reuniones, escalamiento y plantilla de minuta.
3.0	12/10/2026 21:32	Andrada, Juan Pablo	Revisión integral para la entrega: glosario de siglas y términos, propósito y guía de lectura, responsables y horas estimadas, roles actualizados (moderador y permisos por panel) y eliminación de todos los campos pendientes. Se definen frecuencias, canales y responsable de las minutas.

(*) La versión 1.0 se elaboró durante el Sprint 0, antes de que el equipo usara control de versiones, por lo que su fecha y hora exactas no quedaron registradas. Desde la versión 2.0, cada cambio se registra con fecha, hora y autor.

Contenido

1. Glosario
2. Objetivo
3. Interesados
4. Matriz de poder e interés
5. Matriz de comunicaciones
6. Reuniones
7. Canales y herramientas
8. Flujo de la comunicación
9. Escalamiento y gestión de cambios
10. Convenciones del equipo
11. Plantilla de minuta

Qué es este documento. El plan de comunicación define qué información se intercambia en el proyecto, quién la envía, quién la recibe, por qué canal, con qué frecuencia y en qué formato.

Para qué sirve. Asegura que el equipo trabaje coordinado, que el docente conozca el avance y que, cuando la plataforma esté en uso, vecinos, funcionarios y organismos estén informados del estado de cada petición.

Relación con los demás entregables. Toma los interesados identificados en el Project Charter (Entregable 1). Las reuniones aquí definidas son el paquete 1.1.5 de la EDT (Entregable 3) y su tiempo se incluye en las horas del Entregable 1.

Glosario

Siglas y términos que se usan en este documento, ordenados alfabéticamente. Cada uno se explica en lenguaje simple para que el documento pueda leerse sin conocimientos técnicos previos.

Término	Significado
Administrador	Rol que modera, gestiona usuarios y áreas, y accede al panel analítico.
Anonimato	Regla por la que un vecino nunca ve quién creó o firmó una petición.
Área	Dependencia del municipio responsable de un grupo de categorías (por ejemplo, Salud u Obras públicas).
Bandeja	Pantalla donde cada funcionario ve las peticiones de su área ordenadas por prioridad para responderlas.
Barrio (zona)	Cada uno de los 111 barrios de Córdoba y Villa Allende cargados en el sistema con su ubicación.
Código del documento (ENTS-GP)	Identificador de cada entregable: ENTS-GP-01 a ENTS-GP-07 (GP = gestión del proyecto).
Commit	Cada cambio guardado en el repositorio, con autor, fecha y descripción.
CSV / Excel	Formatos de planilla de cálculo usados para exportar reportes.
Día hábil	Día de trabajo del equipo (lunes a viernes, sin feriados). Las duraciones del cronograma se expresan en días hábiles.
Dueño (CEO)	Cuenta única del responsable del proyecto: además de administrar, cambia roles y define los permisos de cada rol.
EDT / WBS	Estructura de desglose del trabajo (en inglés, Work Breakdown Structure): descomposición jerárquica del proyecto en entregables y paquetes de trabajo.
Elevación	Aviso automático a los funcionarios del área cuando una petición alcanza 50 firmas.
Entregable	Resultado verificable que produce el proyecto (un documento, un módulo del sistema, una presentación).
ENTS	Everyone Needs To Smile ("Todos necesitan sonreír"): nombre del proyecto y de la plataforma.
Firma	Apoyo de un vecino a una petición publicada. Cada persona puede firmar una sola vez y retirar su firma.
Funcionario	Rol de un empleado del municipio: responde las peticiones de su área. Lo aprueba un administrador.
GitHub	Plataforma donde se guarda el código con su historial de cambios (repositorio).
HTTPS	Protocolo de comunicación cifrado entre el navegador y el servidor.
HU	Historia de usuario: necesidad escrita desde el punto de vista del usuario con la forma "Como [rol], quiero [acción] para [beneficio]". Se numeran HU01, HU02…
Interesado	Persona u organización afectada por el proyecto o que influye en él (en inglés, stakeholder).

Término	Significado
Matriz de poder e interés	Cuadro que clasifica a los interesados según su poder sobre el proyecto y su interés en él, para decidir cómo comunicarse con cada uno.
Minuta	Registro escrito de una reunión: temas, decisiones y tareas asignadas.
Moderación	Revisión de las peticiones y comentarios para que no se publique contenido ofensivo ni datos personales.
Moderador	Rol que revisa peticiones, comentarios y publicaciones; no administra usuarios.
Netlify	Servicio que publica el sitio web con HTTPS cada vez que se actualiza el repositorio.
ONG	Organización no gubernamental: organización social sin fines de lucro.
Panel analítico	Pantalla de administración con indicadores de uso, moderación y participación, exportable a Excel y PDF.
Paquete de trabajo	Último nivel de la EDT: un entregable concreto que se puede asignar, estimar y verificar.
PDF	Formato de documento portable que se ve igual en cualquier dispositivo.
Permisos por panel	Configuración que define, para cada rol, qué paneles puede ver y en cuáles puede modificar. Solo la cambia el dueño.
Petición	Pedido que un vecino publica sobre un problema de su barrio (por ejemplo, un bache o falta de alumbrado).
Prioridad por firmas	Nivel de una petición según su cantidad de firmas: nueva (0–4), baja (5–9), media (10–19), alta (20–49) y máxima (50 o más).
Product backlog	Lista priorizada de todo lo que hay que construir en el producto, expresada en historias de usuario.
Project Charter	Acta de constitución: documento que autoriza formalmente el proyecto y fija su propósito, objetivos y recursos.
Prueba automática	Programa que verifica que una parte del código da el resultado esperado, sin intervención manual.
Pull Request (PR)	Pedido para integrar los cambios de una rama a la principal, que otro integrante revisa antes de aceptar.
Rama (branch)	Copia paralela del código para trabajar un cambio sin afectar la versión principal (main).
Repositorio	Lugar donde se guarda el código fuente con todo su historial de versiones.
Retrospectiva	Reunión al final de cada sprint para analizar qué mejorar en la forma de trabajar.
Riesgo	Evento incierto que, si ocurre, afecta al proyecto. Se evalúa por su probabilidad y su impacto.
Rol (rango)	Tipo de cuenta que define qué puede hacer cada usuario: vecino, funcionario, moderador, administrador o dueño.
Score de urgencia	Puntaje de 0 a 100 que calcula el sistema según la gravedad de la categoría, palabras de riesgo, firmas, velocidad de apoyo y fotos.
Seguimiento	Etapas por las que pasa una petición publicada: recibida, en revisión, derivada, en obra y resuelta.

Término	Significado
Sprint	Ciclo de trabajo de duración fija (en este proyecto, 2 semanas) al final del cual se muestra un avance funcionando.
Vecino	Rol base: crea, firma y comenta peticiones. Para los demás vecinos es anónimo.
Versión del documento	Número que cambia con cada modificación registrada en el historial de revisión (1.0, 2.0, 3.0).

1. Objetivo

Que cada interesado reciba la información que necesita, en el momento oportuno y por el canal adecuado, evitando tanto la falta de información como el exceso de mensajes.

2. Interesados

Para cada interesado se indica qué necesita saber, cuánto poder tiene sobre el proyecto, cuánto le interesa y la estrategia de comunicación resultante (explicada en la sección 3).

Interesado	Necesidad de información	Poder	Interés	Estrategia
Docente (Ing. Loza)	Avance, cambios de alcance y entregables	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Equipo de proyecto	Tareas, bloqueos y decisiones técnicas	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Áreas del municipio y funcionarios	Peticiones de su área, prioridad y elevaciones	Alto	Medio	Mantener satisfechos
Vecinos	Estado de sus peticiones y de su barrio	Bajo	Alto	Mantener informados
ONG y organizaciones sociales	Reportes por zona y urgencia	Bajo	Medio	Mantener informados
Instituto Cervantes	Resultados del proyecto	Medio	Bajo	Monitorear

3. Matriz de poder e interés

La matriz ubica a cada interesado según su poder (eje vertical) y su interés (eje horizontal). Cada cuadrante define una estrategia: **gestionar de cerca** (comunicación frecuente y participación en decisiones), **mantener satisfechos** (información relevante sin saturar), **mantener informados** (avisos regulares) y **monitorear** (comunicación mínima).



Figura 1. Matriz de poder e interés.

4. Matriz de comunicaciones

Qué se comunica	Emisor	Receptor	Canal	Frecuencia	Formato
Avance y bloqueos	Cada integrante	Equipo	Reunión de seguimiento + WhatsApp	Lunes, miércoles y viernes	Oral / mensaje
Planificación del sprint	Andrada	Equipo	Google Meet + Trello	Inicio de cada sprint (cada 2 semanas)	Backlog priorizado en Trello
Cambios de código	Integrante	Equipo	GitHub: rama + Pull Request	Por cada cambio	Descripción del Pull Request
Publicación de versiones	Andrada	Equipo	Netlify (automática) + aviso por WhatsApp	Por cada versión	Mensaje con el resumen
Minutas de reunión	Jiménez	Equipo	Trello (tarjeta de la reunión)	Después de cada reunión	Minuta (sección 10)
Revisión del sprint	Equipo	Docente	Clase presencial con demostración	Fin de cada sprint	Demostración del sitio
Cambios de alcance	Andrada	Docente	Reunión + correo electrónico	Cuando ocurren	Pedido de cambio
Entregables de gestión	Equipo	Docente	Correo electrónico (PDF)	Según calendario de la cátedra	Documento PDF
Estado de las peticiones	Plataforma	Vecinos	Avisos en la app	Automática, en cada novedad	Notificación
Respuestas oficiales	Funcionarios	Vecinos	Seguimiento de la petición	Por cada actualización	Mensaje + foto

Qué se comunica	Emisor	Receptor	Canal	Frecuencia	Formato
Peticiones elevadas	Plataforma	Funcionarios	Aviso + bandeja del área	Al llegar a 50 firmas	Notificación
Reportes de problemáticas	Administración	Organismos y ONG	Exportes Excel / PDF por correo	Mensual	Reporte

5. Reuniones

El proyecto se organiza en 5 sprints de 2 semanas. Cada sprint empieza con una planificación y termina con una revisión ante el docente y una retrospectiva del equipo.

Reunión	Propósito	Participantes	Frecuencia	Duración
Seguimiento	Cada integrante cuenta qué hizo, qué va a hacer y qué lo bloquea	Equipo	Lunes, miércoles y viernes	15 min
Planificación de sprint	Elegir y repartir las historias del backlog para el sprint	Equipo	Inicio de sprint	45 min
Revisión de sprint	Mostrar lo terminado y recibir devoluciones	Equipo y docente	Fin de sprint	30 min
Retrospectiva	Acordar qué mejorar en la forma de trabajar	Equipo	Fin de sprint	20 min

Tiempo total estimado en reuniones por integrante: **15,4 h** a lo largo del proyecto.

6. Canales y herramientas

Canal	Uso
WhatsApp (grupo del equipo)	Coordinación diaria, avisos rápidos y bloqueos.
Trello	Product backlog, tareas de cada sprint y su estado; minutas de las reuniones.
Google Meet	Reuniones de seguimiento y planificación cuando no son presenciales.
Clases presenciales	Revisiones de sprint y consultas con el docente.
GitHub	Código, Pull Requests, revisión entre integrantes e historial de cambios.
Correo electrónico	Comunicaciones formales con el docente y entrega de documentos.
Plataforma ENTS	Comunicación con vecinos y funcionarios: avisos, seguimiento y comentarios.

7. Flujo de la comunicación

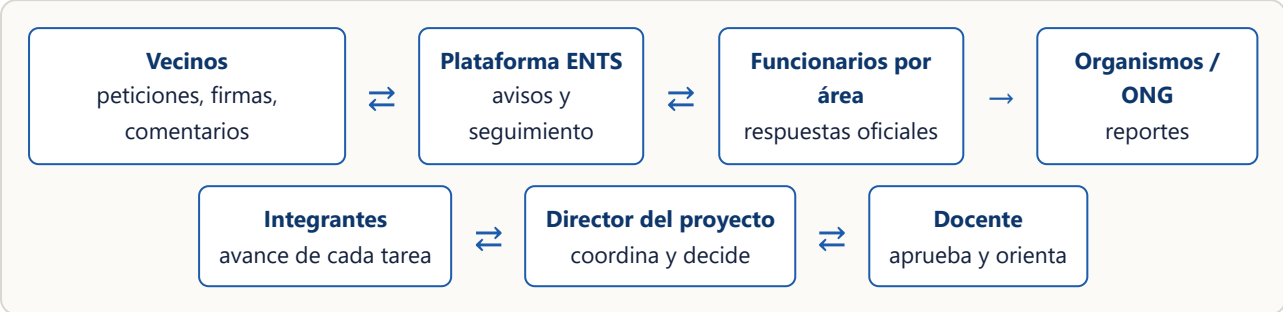


Figura 2. Arriba, la comunicación de la plataforma en uso; abajo, la comunicación interna del proyecto. Las flechas dobles indican ida y vuelta.

8. Escalamiento y gestión de cambios

Escalar un problema es llevarlo al nivel siguiente cuando no se puede resolver en el actual.

1. **Nivel 1 — Integrante:** resuelve el problema dentro de su tarea; si no puede en 1 día hábil, lo avisa en el grupo.
2. **Nivel 2 — Director del proyecto (Andrada):** lo trata en la siguiente reunión de seguimiento; redistribuye tareas o ajusta prioridades.
3. **Nivel 3 — Docente:** los cambios de alcance, de fechas de entrega o los riesgos críticos se presentan al docente con su impacto (procedimiento del Entregable 2, sección 12).

9. Convenciones del equipo

- **Ramas:** la rama principal (`main`) es la versión publicada; cada cambio se hace en una rama propia y se integra con un Pull Request.
- **Mensajes de commit:** en español y describiendo el cambio (por ejemplo, "Score de urgencia calculado automáticamente").
- **Antes de integrar:** revisión del código por otro integrante, pruebas automáticas aprobadas y compilación sin errores.
- **Documentos:** cada modificación se registra en el historial de revisión con versión, fecha, hora y autor.

10. Plantilla de minuta de reunión

La completa Jiménez, Ignacio después de cada reunión y queda guardada en Trello.

Fecha y hora	
Tipo de reunión	Seguimiento / Planificación / Revisión / Retrospectiva
Participantes	

Temas tratados	
Decisiones	
Tareas (qué · quién · para cuándo)	
Próxima reunión	

Los espacios en blanco de la plantilla se completan en cada reunión.
